




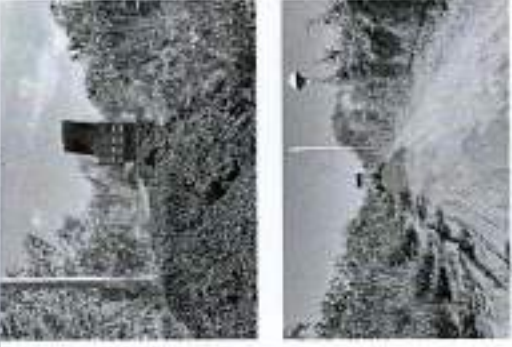
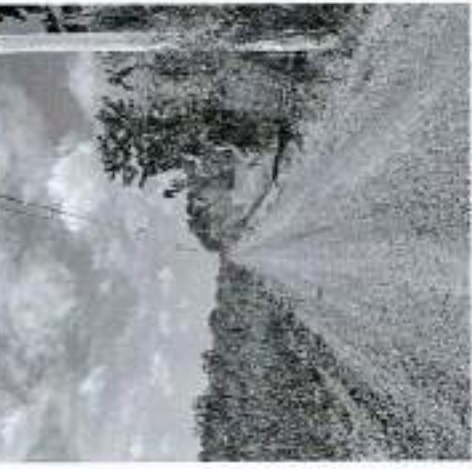











ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
6	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินลูกรังสาย บ้านหนองตา มัน หมู่ที่ 4 อ.งอนสาย พาร์มหมู่ หมู่ ที่ 11	313,388 บาท	ตั้งไว้ 313,388 บาท เบิกจ่าย 309,000 บาท	4,388 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านหนองตา มัน หมู่ที่ 4 อ.งอนสายพาร์มหมู่ หมู่ที่ 11 ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย ตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะความยาว 1,500 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 900 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การคมนาคม	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 24 ธันวาคม 2565					


ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
7	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านหนองไทร หมู่ 5 อ.วังสะพุง ส.บ.บ. 5 อ.วังสะพุง	147,848 บาท	ตั้งไว้ 147,848 บาท เบิกจ่าย - บาท	147,848 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านหนองไทร หมู่ 5 อ.วังสะพุง ส.บ.บ. 5 อ.วังสะพุง ยาว 700 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านหนองไทร หมู่ 5 อ.วังสะพุง ส.บ.บ. 5 อ.วังสะพุง	กกรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสำรวจเส้นทางในการดำเนินงานโครงการผิด					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
8	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังก่อสร้างถนนพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่งๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	929,430 บาท	ตั้งไว้ 929,430 บาท เบิกจ่าย 432,000 บาท	497,430 บาท	ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 5 ถึงเขตติดต่อตำบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังก่อสร้างถนนพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่งๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 24 ธันวาคม 2565					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิง คุณภาพ	ผลกระทบ
9	โครงการซ่อม แซมถนนลูก ดินรังสาช บ้านบางจวน ทองดี ถึง ฟาร์มไก่นาง สุกัญญา หมู่ที่ 6	478,928 บาท	ตั้งไว้ 478,928 บาท เบิกจ่าย 473,000 บาท	5,928 บาท	ซ่อมแซมถนนลูกดินรังสาชบ้านบางจวน ทองดี ถึงฟาร์มไก่สุกัญญา หมู่ที่ 6 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะความยาว 2,300 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 1,380 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การ คมนาคม	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคต่อ ช่วงที่ใกล้ขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อสิ่งหรือแนวทางการ พัฒนา
		25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 24 ธันวาคม 2565					







ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
10	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังกลุ่ม บ้านนา ประเสริฐ อชรส ถึงบ้าน นางกิมหนอย วิมุติกร หมู่ที่ 7	187,494 บาท	ตั้งไว้ 187,494 บาท เบิกจ่าย 181,000 บาท	6,494 บาท	ซ่อมแซมถนนลูกรังกลุ่มบ้านนาประเสริฐ อชรส ถึงบ้านนางกิมหนอย วิมุติกร หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร โดยทำ การลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย ตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะความยาว 600 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 480 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่งๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาด ตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การ คมนาคม	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคและ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 ธันวาคม 2565		 	 		






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
11	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายอย่างลากัง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว	189,233 บาท	ตั้งไว้ 189,233 บาท เบิกจ่าย 185,000 บาท	4,233 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายอย่างลากัง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลา 900 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 540 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอนโยบายทางกรมกิจท้องถิ่นหรือแนวทางการพัฒนา
		22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 ธันวาคม 2565		 			


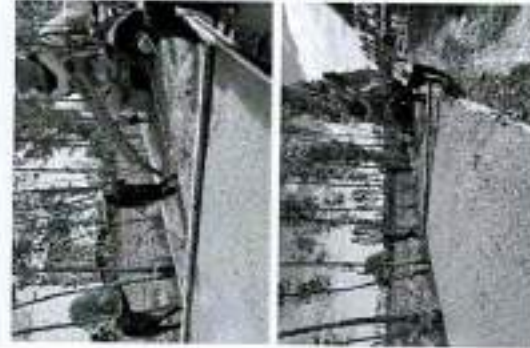

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/ฝ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
12	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนางพียงแก้วบุญทันถึงบ้านนายวิเชียรประภคยา	41,385 บาท	ตั้งไว้ 41,385 บาท เบิกจ่าย 40,000 บาท	1,385 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนางพียงแก้วบุญทัน ถึงบ้านนายวิเชียร ประภคยา หมู่ที่ 8 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยคกแต่งเสร็จเรียบร้อยตลอดสาย ระยะความยาว 200 เมตร ปริมาณดินลูกรังจำนวน 120 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ระหว่างที่บัติน	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา	
	22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 6 ธันวาคม 2565						




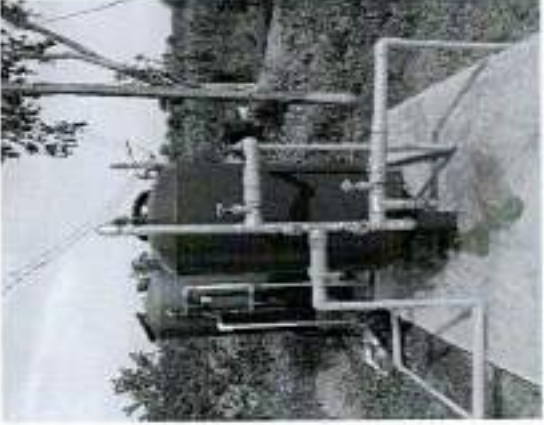













ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ใบแนบพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ/ฝ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิง คุณภาพ	ผลกระทบ
14	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินลูกรังจาก บ้านนาย จงกล แสนถม หมู่ที่ 2 ถึง บ้านนาย ปารมี หนัน เทศมัน หมู่ที่ 9	416,850 บาท	ตั้งไว้ 416,850 บาท เบิกจ่าย 413,000 บาท	3,850 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านนายจงกล แสนถม หมู่ที่ 2 ถึงบ้านนายปารมี หนันเทศ มัน หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะความ ยาว 1,500 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 1,200 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาด ตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การ คมนาคม	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคและ ช่วงที่เฝ้าจับ	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 9 ธันวาคม 2565					
							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
15	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากถนนสายคลองร่วม - เขาลูกช้าง ถึงบ้านคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลร่วม - เขาลูกช้าง ถึงบ้านคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลร่วม	147,484 บาท	ตั้งไว้ 147,848 บาท เบิกจ่าย 144,000 บาท	3,848 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากถนนสายคลองร่วม - เขาลูกช้าง ถึงบ้านคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะความยาว 700 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 420 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับ การคมนาคม	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา	
	10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 29 พฤศจิกายน 2565		 	 			


ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้โดย ข้อบัญญัติ/ฝ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
16	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กกลุ่ม บ้านนาย สังเวียน หมู่ที่ 9	4,125,000 บาท ท้องถิ่น	ตั้งไว้ 665,160 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย เบิกจ่าย 418,300 บาท	246,860 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มบ้านนายสังเวียน หมู่ที่ 9 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังโหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		2 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
17	โครงการติดตั้งกรองน้ำประปาบ้านคลอง หมู่ที่ 10	85,000 บาท ท้องถิ่น	ตั้งไว้ 85,000 บาท เบิกจ่าย 84,000 บาท	1,000 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกรองน้ำประปาบ้านคลอง หมู่ที่ 10 โดยทำการติดตั้งถังกรองน้ำสมิแลเหล็กขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		3 ธันวาคม 2565 ถึง 22 ธันวาคม 2565		 			


ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
18	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินลูกรังจาก บ้านนางนาง กัมพู ถึง ถนนลาดยาง สายโคก กระท้อน - บ้านหัวเขา หมู่ที่ 10	496,144 บาท	ตั้งไว้ 496,144 บาท เบิกจ่าย 459,000 บาท	7,144 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านนางนาง กัมพู ถึงถนนลาดยางสายโคกกระท้อน - บ้านหัวเขา หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็น หลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะความยาว 1,100 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 1,320 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 3 แห่งๆ ละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตาม แบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การ คมนาคม	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ภายหลังการดำเนินงานหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		10 พฤศจิกายน 2565 ถึง 9 ธันวาคม 2565		 			




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
19	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินลูกรังจาก พิงชิงปาร์ค ถึงบ้านโพธิ์ ฉายงาม หมู่ที่ 11	209,925 บาท	ตั้งไว้ 209,925 บาท เบิกจ่าย 206,000 บาท	3,925 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากพิงชิงปาร์ค ถึง บ้านโพธิ์ฉายงาม หมู่ที่ 11 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยทำการลงดินลูกรัง ที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ระยะความยาว 600 เมตร ปริมาณ ดินลูกรัง จำนวน 600 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การ คมนาคม	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 4 ธันวาคม 2565		 	 		


ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
20	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินลูกรังจาก พิชชิงปาร์ค ถึงบ้านศรี เจริญ หมู่ที่ 11	426,955 บาท	ตั้งไว้ 426,955 บาท เบิกจ่าย - บาท	426,955 บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังจาก พิชชิงปาร์ค ถึงบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยทำ การลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย ตบแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะความยาว 1,650 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 1,238 ตบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต. ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทาง พัฒนา
		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับ งบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้าน นางหมู่ย์ มั่งมี ถึง บ้านศรีเจริญ					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
21	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ถึงเขตติดต่อตำบลเขาไม้แก้ว	649,640 บาท	ตั้งไว้ 649,640 บาท เบิกจ่าย 634,000 บาท	15,640 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ถึงเขตติดต่อตำบลเขาไม้แก้ว ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วระยะความยาว 2,500 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 1,875 ลบ. พร้อมทั้งจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1ป้าย ตามแบบแปลนของอบสาคณะเดียวกัน	ประชาชนมีถนนสำหรับ การคมนาคม	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน		ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
	1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565		-				









ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
22	โครงการ ซ่อมแซมถนน ดินลูกรังกลุ่ม บ้านนาง ถนอม พงษ์ ประดิษฐ์ หมู่ ที่ 12	334,080 บาท	ตั้งไว้ 334,080 บาท ผูกพันเบิกจ่าย เบิกจ่าย 330,000 บาท	4,080 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังกลุ่มบ้าน นางถนอม พงษ์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 12 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็น หลุมบ่อพร้อมเกลี่ยคกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดสายระยะความยาว 1,200 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 960 ลบ.ม. พร้อม จัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ แปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมี ถนน สำหรับ การ คมนาคม	-
		กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว เสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		24 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565					




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากตลาดยาง รพช. ถึงบ้านนางสาว ต.ควน หมู่ที่ 13	359,400 บาท	ตั้งไว้ 359,400 บาท เบิกจ่าย 315,600 บาท	43,800 บาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนตลาดยาง รพช. ถึงบ้านนางสาว ต.ควน หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 198 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 594 ตารางเมตร พร้อมส่งคู่มือทางทั้งสองข้าง พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		2 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565					


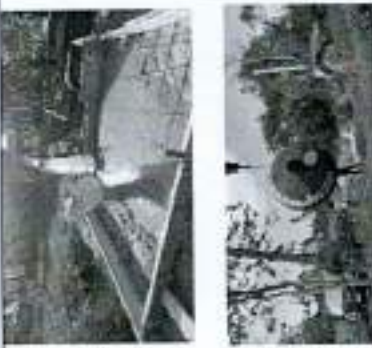

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้โดยบัญชี/ฝ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
24	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านนายคำเงินวังกะพงษ์ ถึงบ้านนางสียา	189,233 บาท	ตั้งไว้ 189,233 บาท ผูกพันเบิกจ่าย เบิกจ่าย 185,000 บาท	4,233 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากบ้านนายคำเงินวังกะพงษ์ ถึงบ้านนางสียา วงษ์เพชร หมู่ที่ 13 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมบ่อพร้อมเกลี่ย ตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ระยะความยาว 900 เมตร ปริมาณดินลูกรัง จำนวน 540 ลบ.ม. พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคม	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา	
	15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 4 ธันวาคม 2565	-	-		-	-	
<b>รวม 24 โครงการ</b>			ตั้งไว้ 8,504,937 บาท เบิกจ่าย 6,295,100 บาท	<b>คงเหลือ 2,209,837 บาท</b>			





รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566






\*\*\*\*\*

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในชัยภูมิ/ผู้จัด/ฝ่ายขาดเงินสะสม (ผู้บริหารท้องถิ่น)	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจ้างเหมาบำรุงรักษาปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ อบต.ลาดตะเคียนบ้านคลองร่วม หมู่ที่ 9	-	(ผู้บริหารท้องถิ่น) อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1)) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โอนเพิ่ม 25,000 บาท เบิกจ่าย 25,000 บาท	-	จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อเกลี่ยเศษขยะจากบ่อลงไปในบ่อเพื่อให้รถขยะไปทิ้งได้ตามปกติ ด้านที่ 1 ยาว 83 เมตร ด้านที่ 2 ยาว 86 เมตร ด้านที่ 3 ยาว 58 เมตร ด้านที่ 4 ยาว 79 เมตร โดยทำการปรับปรุงทิ้งขยะของ อบต.ลาดตะเคียน โดยทำการจ้างเหมารถแบคโฮ เกลี่ยขยะลงไปในบ่อขยะ	ลดปริมาณขยะลับบ่อขยะ	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภาพหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา	
	ธันวาคม 2565						
							






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ใช้งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ใช้งบประมาณอุดหนุน/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลการทบทวน
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านโปร่งเข้ถึงเขตเทศบาลโปร่งเข้ ถึงเทศบาลสระบัว	7,200,000 บาท	<p>(ตามมติสภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566</p> <p>อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 6))</p> <p>โอนเพิ่ม 672,500 บาท</p> <p>ก่อนหัก/สุกพัน 672,500 บาท</p> <p>เบิกจ่าย 578,000 บาท</p>	94,500 บาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านโปร่งเข้ ถึงเขตเทศบาลสระบัว ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์โหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	ถนนได้มาตรฐาน	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	25 ตุลาคม 2566 ถึง 8 ธันวาคม 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
							




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านนางประยอม วิ	625,000 บาท	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณ 625,000 บาท (ครึ่งที่ 6)) โอนเพิ่ม 625,000 บาท ก่อนมีผูกพัน 625,000 บาท เบิกจ่าย 570,000 บาท	55,000	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านนางประยอม วิเท โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อขุดเจาะแล้วสามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม.และติดตั้งเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมก่อสร้างฐานรากและติดตั้งปั้มน้ำแบบซับเมอร์ส 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย และวางท่อเมนดีประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ท่อพีวีซี ชั้น 8.5) ระยะความยาว 200 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต. ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และเพียงพอ	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางด้านการพัฒนา	
	18 ตุลาคม 2566 ถึง 1 ธันวาคม 2566						





ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
4	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านกระท่อมมา	195,000 บาท	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณ 195,000 บาท (ครั้งที่ 6)) โอนเพิ่ม 195,000 บาท เบิกจ่าย 194,000 บาท	1,000 บาท	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านกระท่อมมา โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อขุดเจาะแล้วสามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบแปลนของอบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	12 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังจากดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการปฏิบัติงานหรือแนวทางทางการพัฒนา
							






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณที่จัดไว้เป็นสัดส่วน	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
5	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 1 จากแยกถนนสายหนองคล้า - โคกกระทอน หมู่ที่ 10 โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณสมบัติของระบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนก้อหนด	777,285 บาท	งบประมาณที่จัดไว้ ข้อบัญญัติ/ฝ่ายขาดเงินสะสม	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 473,000 บาท ผูกพันเบิกจ่าย 471,000 บาท	2,000 บาท	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 1 จากแยกถนนสายหนองคล้า - โคกกระทอนถึงบ้านหนองหมี่ หมู่ที่ 10 โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณสมบัติของระบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนก้อหนด	เห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเวลายากลำบาก	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	23 กันยายน 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา	
				 	 			









ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
6	โครงการ วางระบาย น้ำ หมู่ที่ 2 จากบ้าน นายพนม ป้อมเรือง ถึงบ้านนาง สังวาล ย้อยตา	6,000,000 บาท ท้องถิ่น	(ตามมติ สภา อบต.ลาด ตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 247,000 บาท ผูกพันเบิกจ่าย 246,000 บาท	1,000 บาท	ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.ลาด ตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และระบาย น้ำ	-
		กรอบของแผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		26 กันยายน 2566 ถึง 25 ตุลาคม 2566		 	 		




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 4 จากบ้านหนองตามัน ถึงเขตติดต่อตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณสมบัติและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำพวด	2,640,000 บาท ท้องถิ่น	(ตามมติสภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 473,000 บาท ผูกพันงบจ่าย 471,000 บาท	2,000 บาท	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 4 จากบ้านหนองตามัน ถึงเขตติดต่อตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณสมบัติและรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำพวด	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเวลากลางคืน	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	23 กันยายน 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
							

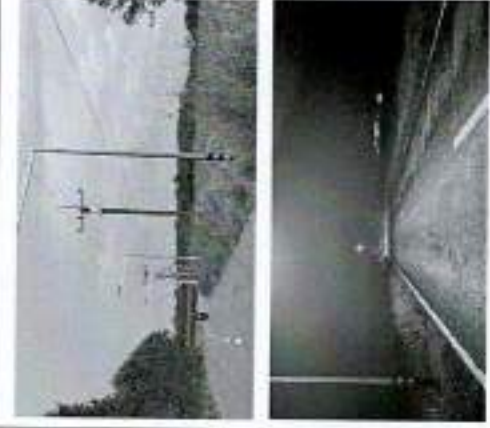ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
8	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 5 จากบ้านโป่งรังเข้ ถึงบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 ถึงเขตติดต่อ	9,365,000 บาท ท้องถิ่น	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 473,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 471,000 บาท	2,000 บาท	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 5 จากบ้านโป่งรังเข้ ถึงบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 ถึงเขตติดต่อตำบลกอกสมบูรณ์ โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณลักษณะรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำหนด	เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเวลากลางคืน	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน		ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
	23 กันยายน 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566						

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
9	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 ถนนสาย 9 ถนนสายหลังโรงงานพิพิธ	3,875,000 บาท ท้องถิ่น	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 498,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 496,000 บาท	2,000 บาท	ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 ถนนสายหลังโรงงานพิพิธ สภาพถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,100 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังเกลี่ยตบแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะทาง 1,450 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	ประชาชนมีถนนสำหรับก้าวคมนาคม	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	26 กันยายน 2566 ถึง 25 ตุลาคม 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะช่วยที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
			 	 			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
10	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 จากถนนสาย 304 ถึงเทศบาลสระบัว หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อดับบลูเขาไม้แก้ว โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณลักษณะรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนก่ำหนด	20,400,000 บาท ท้องถิ่น	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 473,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 471,000 บาท	2,000 บาท	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 จากถนนสาย 304 ถึงเทศบาลสระบัว หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อดับบลูเขาไม้แก้ว โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณลักษณะรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนก่ำหนด	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังจากดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น		ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
	23 กันยายน 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566						






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
11	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง	9,026,000 บาท	(ตามมติ สภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 378,000 บาท ผู้กัณฑ์เบิกจ่าย 376,000 บาท	2,000 บาท	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง เชื่อมต่อตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ โดยทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 12 ชุด ตามคุณลักษณะรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำหนด	-	-
	การขอของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา	
	23 กันยายน 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566						




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
12	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 13 บ้านคลองยาง ตำบลหนองคล้า-โคก	1,727,300 บาท	(ตามมติสภา อบต.ลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อนุมัติการโอนงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 12)) โอนเพิ่ม 473,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 471,000 บาท	2,000 บาท	ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน หมู่ที่ 13 บ้านคลองยางจากถนนสายหนองคล้า - โคกกระทอนถึงเขตติดต่อตำบลหาดนางแก้ว โดยทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน 15 ชุด ตามคุณลักษณะรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนกำหนด	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ ละช่วงที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา	
	23 กันยายน 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566						
<b>รวม 12 โครงการ</b>				โอนเพิ่ม 5,005,500 บาท เบิกจ่าย 4,840,000 บาท	<b>คงเหลือ 165,500 บาท</b>		


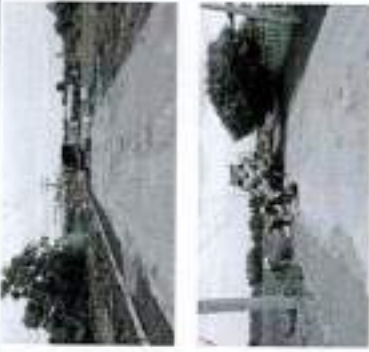

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2566 มติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1/2566 (ครั้งที่ 3) วันที่ 7 เมษายน 2566  
 \*\*\*\*\*






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
1	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนางบุญเรือง รัตติงกันบ้านรางบัว ประปา หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนางบุญเรือง รัตติงกันก่อสร้างฐานคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำโตะเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร และเครื่องปั๊มเหยยโซ่ง 2 นิ้ว ขนาด 2 แรง พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	190,000 บาท	ตั้งไว้ 184,000 บาท เบิกจ่าย - บาท	184,000 บาท	ติดตั้งถังเก็บน้ำ ประปา หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนางบุญเรือง รัตติงกัน โดยทำการก่อสร้างฐานคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำโตะเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร และเครื่องปั๊มเหยยโซ่ง 2 นิ้ว ขนาด 2 แรง พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน		ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
	อยู่ระหว่างดำเนินการ						

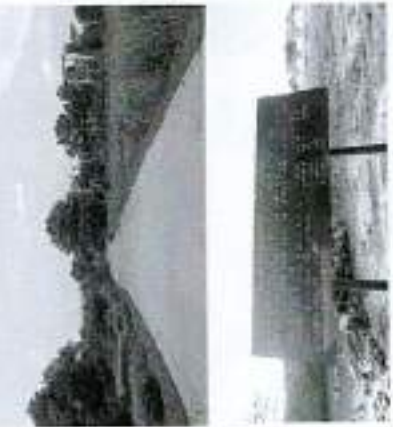






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แบบพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงิน สะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
2	โครงการ ติดตั้งถังเก็บ น้ำประปา หมู่ที่ 1กลุ่ม บ้านหนอง คล้า	190,000 บาท	ตั้งไว้ 184,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย - บาท	184,000 บาท	ติดตั้งถังเก็บน้ำ ประปา หมู่ที่ 1 กลุ่ม บ้านหนองคล้า โดยทำการก่อสร้าง ฐานคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์ กลาส ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร และ เครื่องปั๊มลอยโซ่ง 2 นิ้ว ขนาด 2 แรง พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อปท.ลลิตตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		15 ตุลาคม 2566 ถึง 11 พฤศจิกายน 2566		 	 		





ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
3	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ช้างละ 1 เมตร พร้อมคอนกรีต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังให้ต่างท้องถิ่นสองข้าง ฝังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	470,000 บาท	ตั้งไว้ 470,000 บาท เบิกจ่าย 468,000 บาท	2,000 บาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายสังเวียน แสนถม โดยทำการลงดินปลูกฝังขยาลูใต้ทาง ช้างละ 1 เมตร พร้อมคอนกรีต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังให้ต่างท้องถิ่นสองข้าง ฝังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		23 มิถุนายน 2566 ถึง 6 สิงหาคม 2566					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
4	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสุบินถึงบ้านนายบุญชู โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมลงอุโมงค์ไฟส่องสว่างทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	120,000 บาท ท้องถิ่น	ตั้งไว้ 120,000 บาท เบิกจ่าย 119,500 บาท	500 บาท	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสุบินถึงบ้านนายบุญชู โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมลงอุโมงค์ไฟส่องสว่างทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		28 มิถุนายน 2566 ถึง 27 กรกฎาคม 2566					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านนางสมาน สอนตอน	470,000 บาท	ตั้งไว้ 470,000 บาท เบิกจ่าย 467,000 บาท	3,000 บาท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านนางสมาน สอนตอน โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมก่อสร้างฐานรากและติดตั้งชั้นเมอร์ ขนาด 1.5 แร่งม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย และวางท่อเมนตีประปาขนาด 2 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ระยะความยาว 500 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		22 กรกฎาคม 2566 ถึง 4 กันยายน 2566		 	 		






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
6	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายงกล แสนงม ถึงศาลาแดง โดยทำการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร ยาว 770 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	430,000บาท	ตั้งไว้ 423,500 บาท ผู้พัน/เบิกจ่าย 413,500 บาท	10,000 บาท	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายงกล แสนงม ถึงศาลาแดง โดยทำการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เมตร ยาว 770 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		1 กันยายน 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566		 	 		






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
7	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ	240,000 บาท	ตั้งไว้ 240,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย - บาท	240,000 บาท	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ โดยทำการเปลี่ยนถังรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมเปลี่ยนถึงกรองสนิมเหล็ก พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ						





ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ถนนเลียบบนเลียบบนโคลงไม้เสียบถึงบ้านนางสมาน สองตอน	250,000 บาท	ตั้งไว้ 250,000 บาท เบิกจ่าย 240,000 บาท	10,000 บาท	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ถนนเลียบบนเลียบบนโคลงไม้เสียบถึงบ้านนางสมาน สองตอน สภาพเดิมถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังเกลี่ย ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระยะทาง 500 เมตร หรือมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน		ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแผนทางการพัฒนา
	12 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566						




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
9	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองมะหนู หมู่ที่ 3	50,000 บาท	ตั้งไว้ 50,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย - บาท	50,000 บาท	ปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองมะหนู หมู่ที่ 3 โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 3 แร่ง พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ท่อ พีวีซี ขึ้น 8.5 ระยะความยาว 300 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต. สาคะตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-










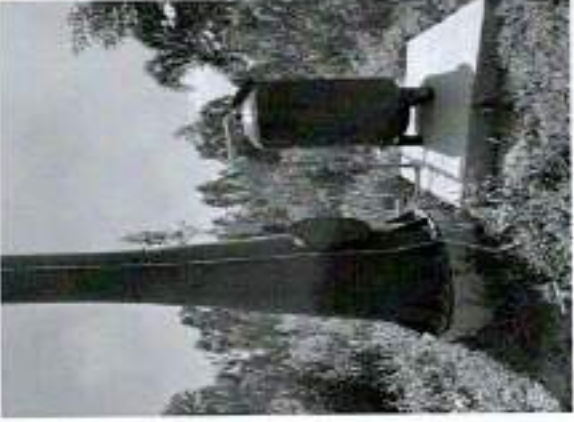
ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/รายชดเชยเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
10	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนน 304 ถึง บ้านนายทองใบ แก้วศรีศรี	500,000 บาท	ตั้งไว้ 490,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 489,500 บาท	500 บาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากถนน 304 ถึง บ้านนายทองใบ แก้วศรี ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		1 กันยายน 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566		 	 	-	-






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
11	โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองงมหนู	200,000 บาท	ตั้งไว้ 184,000 บาท ผูกพันเบิกจ่าย 183,000 บาท	1,000 บาท	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านหนองงมหนู โดยทำการก่อสร้างฐานคอนกรีต ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร และเครื่องปั๊มเหยยโซ่ง 2 นิ้ว ขนาด 2 แรงม้า พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	15 ตุลาคม 2566 ถึง 11 พฤศจิกายน 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางกาการพัฒนา
				 	 		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
12	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเบา	90,000 บาท	ตั้งไว้ 90,000 บาท เบิกจ่าย 86,500 บาท	3,500 บาท	ติดตั้งเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเบา โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
	10 มิถุนายน 2566 ถึง 9 กรกฎาคม 2566		 				

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
13	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ บ้านหนองหมาหู หมู่ที่ 3	90,000 บาท	ตั้งไว้ 90,000 บาท เบิกจ่าย 86,500 บาท	3,500 บาท	ติดตั้งเหล็กกรองน้ำ บ้านหนองหมาหู หมู่ที่ 3 โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
	10 มิถุนายน 2566 ถึง 9 กรกฎาคม 2566						




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
14	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อต้าย	90,000 บาท	ตั้งไว้ 90,000 บาท เบิกจ่าย 86,500 บาท	3,500 บาท	ติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อต้าย โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนา
		10 มิถุนายน 2566 ถึง 9 กรกฎาคม 2566		 		-	-




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ใบแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ใบข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
15	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ศักดิ์	90,000 บาท	ตั้งไว้ 90,000 บาท เบิกจ่าย 86,500 บาท	3,500 บาท	ติดตั้งเหล็กกรองน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านไร่หนักศักดิ์ โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	
		10 มิถุนายน 2566 ถึง 9 กรกฎาคม 2566		 			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมชาย ภู่อังถึงบ้านนายสมชาย ภู่อัง ถึงโครงการบ้านเอ่งเฮง	500,000 บาท	ตั้งไว้ 494,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 493,500 บาท	500 บาท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมชาย ภู่อัง ถึงโครงการบ้านเอ่งเฮง ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	1 กันยายน 2566 ถึง 15 ตุลาคม 2566	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
				 	 		






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
17	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านโคก หมู่ที่ 4	60,000 บาท	ตั้งไว้ 60,000 บาท ผูกพันเบิกจ่าย - บาท	60,000 บาท	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านโคก หมู่ที่ 4 โดยทำการลงดินบริเวณฝาย ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังจากดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไป หรือแนวทางการพัฒนา
		อยู่ระหว่างดำเนินการ					












ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิง คุณภาพ	ผลกระทบ
18	โครงการชุด ออกคลอง หน้าฝาย บ้านโคก หมู่ ที่ 4	500,000 บาท	ตั้งไว้ 450,000 บาท เบิกจ่าย 403,000 บาท	47,000 บาท	ขุดลอกคลองหน้าฝายบ้านโคก หมู่ที่ 4 สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ปากคลอง ขนาดปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.10 เมตร รวมเป็นความลึก 3.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		13 มิถุนายน 2566 ถึง 27 กรกฎาคม 2566					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบบ
19	โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จาก บ้านนาง พิศมัย มาสา ถึง คลอง สะพานนาง	500,000 บาท ท้องถิ่น	ตั้งไว้ 476,000 บาท เบิกจ่าย 474,000 บาท	2,000 บาท	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางพิศมัย มาสา ถึง คลองสะพานนาง สภาพเดิมถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมแก้ไขตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วระยะทาง 1,400 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่แก้ไข	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		22 มิถุนายน 2566 ถึง 11 กรกฎาคม 2566					






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ ข้อบัญญัติว่าด้วยชาตเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
20	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองกง หมู่ที่ 4	400,000 บาท	ตั้งไว้ 400,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย - บาท	400,000 บาท	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองกง หมู่ที่ 4 โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ ละช่วงที่ เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข สู่ไปหรือแนวทางการพัฒนา
		อยู่ระหว่างดำเนินการ					

ที่	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณที่จัดไว้ ข้อบัญญัติ/เจ้าชขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิง คุณภาพ	ผลกระทบ
21	โครงการขุด เจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ ที่ 4 บ้าน หนองตามัน	200,000 บาท	จัดไว้ 195,000 บาท เบิกจ่าย 194,000 บาท	1,000 บาท	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 บ้าน หนองตามัน โดยทำการขุดเจาะบ่อ บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อขุดเจาะบ่อแล้วสามารถผลิตน้ำได้ ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้ง จับแมอร์ส ขนาด 1.5 แรงพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดทำป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตาม แบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการ ดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหาหรือ อุปสรรคแต่ละ ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการ พัฒนา
		28 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 สิงหาคม 2566		 	 		






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
22	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านหนองกุง โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมก่อสร้างฐานรากและติดตั้งขั้วเมอร์ส ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จ พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต. ลาดตะเคียน	420,000 บาท	ตั้งไว้ 420,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 419,000 บาท	1,000 บาท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุง โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมก่อสร้างฐานรากและติดตั้งขั้วเมอร์ส ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จ พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต. ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		24 สิงหาคม 2566 ถึง 7 ตุลาคม 2566		 	 		






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
23	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพธิ์	195,000 บาท	ตั้งไว้ 195,000 บาท เบิกจ่าย 194,000 บาท	1,000 บาท	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพธิ์ โดยทำการชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อชุดเจาะบ่อแล้ว สามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงพพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ ละช่วงที่ เกิดขึ้น	ชี้แจงถึงข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ค่าไปหรือแนวทางการพัฒนา
		15 มิถุนายน 2566 ถึง 4 กรกฎาคม 2566		 			






ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
24	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโปร่งเข้ หมู่ที่ 5	400,000 บาท	ตั้งไว้ 400,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย - บาท	400,000 บาท	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองโปร่งเข้ หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางกายภาพ ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ						

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
25	โครงการขุดลอกคลองโปรงเข้ หมู่ 5	200,000 บาท	ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 181,000 บาท	19,000 บาท	ขุดลอกคลองโปรงเข้ หมู่ที่ 5 สภาพเดิม ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ปากคลองขนาดปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.00 เมตร รวมเป็นความลึก 3.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		13 มิถุนายน 2566 ถึง 12 กรกฎาคม 2566		 	 		



ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
26	โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน นายบัญญัติศรีเครือทรัพย์	200,000 บาท	ตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่าย 197,000 บาท	3,000 บาท	ผลเชิงปริมาณ ขุดสระน้ำ หมู่ที่ 5 กลุ่มบ้าน นายบัญญัติศรีเครือทรัพย์ โดยทำการขุดสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.สาตตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคตั้งแต่ช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		26 พฤษภาคม 2566 ถึง 24 มิถุนายน 2566					
							

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
27	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทราย กลุ่มบ้านนางเจ็ดเป็ลือรังตัน	195,000 บาท	ตั้งไว้ 195,000 บาท เบิกจ่าย 194,000 บาท	1,000 บาท	ผลเชิงปริมาณ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทราย กลุ่มบ้านนางเจ็ดเป็ลือรังตัน โดยทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เมื่อขุดเจาะบ่อแล้ว สามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ขนาด 1.5 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดทำป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		28 กรกฎาคม 2566 ถึง 16 สิงหาคม 2566		 	 		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านหนองไทร โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย และวางท่อเมนสู่ประปาขนาด 2 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ระยะความยาว 100 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.สาตตะเคียน	400,000 บาท	ตั้งไว้ 400,000 บาท ผูกพัน/เบิกจ่าย 399,000 บาท	1,000 บาท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย และวางท่อเมนสู่ประปาขนาด 2 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ระยะความยาว 100 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.สาตตะเคียน	-	-
	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา	
	28 สิงหาคม 2566 ถึง 8 ตุลาคม 2566		 	 			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ
29	โครงการขุดลอกคลองโคกชัน หมู่ที่ 6	500,000 บาท	ตั้งไว้ 497,000 บาท เบิกจ่าย 445,000 บาท	52,000 บาท	ขุดลอกคลองโคกชัน หมู่ที่ 6 สภาพเดิมปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ปากคลอง ขนาดปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 2,600 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 เมตร รวมเป็นความลึก 3.50 เมตร พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน	-	-
		กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังการดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วงที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไปหรือแนวทางการพัฒนา
		25 พฤษภาคม 2566 ถึง 8 กรกฎาคม 2566	
